

IL DISPIEGAMENTO DEL PROCESSO CIVILE
TELEMATICO NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO

Giustizia on line

STATO AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA'

Dicembre 2014

Indice

PCT Sud – Giustizia On Line

- ▶ Il progetto
- ▶ Valore aggiunto
- ▶ Stato di avanzamento
- ▶ Sintesi finanziaria
- ▶ Risultati
- ▶ Adempimenti
- ▶ Criticità riscontrate
- ▶ Prossimi step

PCT Sud - GOL: il progetto

- ▶ **Progetto PCT Sud – Giustizia On Line** nasce dall'esigenza di ridurre i tempi ed i costi della giustizia civile nelle Regioni del Sud, attraverso tre linee di azione che mirano alla diffusione delle notifiche telematiche e dei decreti ingiuntivi telematici in modalità avanzata.
- ▶ L'obiettivo del PCT Sud non è soltanto quello di dematerializzare integralmente i flussi informativi e di comunicazione tra uffici giudiziari, legali ed altri professionisti, e le parti del procedimento inerenti i decreti ingiuntivi, ma anche di **accompagnare gli utenti e gli stakeholder nella transizione verso un sistema di comunicazioni elettroniche con allegati provvedimenti nativi telematici.**



PCT Sud - GOL: valore aggiunto

Tenuto conto delle acquisizioni di beni e servizi messi in campo nell'ambito del Progetto PCT Sud, **Cancellieri e Magistrati hanno quindi a disposizione:**

- ▶ una **dotazione hardware** completa di tutte le funzionalità e le applicazioni necessarie alla gestione telematica del processo civile (pc portatile, scanner, software);
- ▶ **servizi di addestramento** sull'utilizzo della «Consolle del Magistrato» per figure professionali (magistrati e cancellieri) attraverso lezioni d'aula e training on the job;
- ▶ **servizio di assistenza** continua e specialistica sulla «Consolle del Magistrato».



PCT Sud - GOL: stato di avanzamento

Rispetto alla dotazione finanziaria attribuita a ciascun CISIA, responsabile per gli acquisti per la regione di competenza, la cartina di seguito consente di avere un quadro complessivo dello stato di avanzamento del Progetto, in termini di impegni conclusi rispetto alla dotazione finanziaria iniziale.

La maggior parte delle regioni hanno completato le procedure di spesa per l'acquisto di beni e servizi.

Rimangono **da impegnare** un totale di somme residue pari a circa **€ 39.000**.

Inoltre è **in corso** la gara per l'affidamento del servizio **Centro Competenza Magistrati**, di assistenza specialistica ai magistrati per l'utilizzo dell'applicativo *Consolle del Magistrato*.



-  Regioni che hanno completato le procedure di acquisto utilizzando tutte le risorse a disposizione
-  Regioni che non hanno completato le procedure di acquisto utilizzando tutte le risorse a disposizione

PCT Sud - GOL: stato di avanzamento

Il progetto si è articolato in tre linee di Azione:

- **Linea di Azione 1:** diffusione delle notifiche telematiche in modalità avanzata stimolando la creazione di provvedimenti nativi telematici;
- **Linea di Azione 2:** diffusione dei decreti ingiuntivi telematici attraverso la diffusione del c.d. PCT relativamente al rito monitorio;
- **Linea di Azione 3:** volta a realizzare specifiche azioni di monitoraggio sul progetto e di comunicazione pubblica sui progressi in itinere.

PCT Sud – GOL	Dotazione finanziaria iniziale	Dotazione finanziaria rimodulata*
Linea di Azione 1	€ 4.638.312	€ 4.638.312
Linea di Azione 2	€ 1.638.000	€ 1.583.000
Linea di Azione 3	€ 707.688	€ 707.688
Assistenza Tecnica	€ 216.000	€ 271.000
TOTALE	€ 7.200.000	€ 7.200.000

*Nella scadenza di monitoraggio rinforzato di novembre 2014 è stata comunicata nuova dotazione finanziaria del Progetto che prevede uno spostamento di risorse dalla Linea 2 all'Assistenza Tecnica per € 55.000. Tali risorse, rivenienti dalla Delibera CIPE 111/2012, si rendono necessarie a fronte dello slittamento delle attività di progetto.

PCT Sud - GOL: stato di avanzamento

Il progetto è ad uno stato avanzato di realizzazione (circa 90%), come evidenziato dalla tabella sottostante che riporta gli impegni per singola Linea di Azione e la percentuale di avanzamento rispetto alla dotazione finanziaria.

PCT Sud – GOL	Dotazione finanziaria rimodulata	Impegni	Avanzamento percentuale
Linea di Azione 1	€ 4.638.312	€ 4.154.525	89,6%
Linea di Azione 2	€ 1.583.000	€ 1.544.986	97,6%
Linea di Azione 3	€ 707.688	<i>Procedura di gara in corso</i>	N/A
Assistenza Tecnica	€ 271.000	€ 270.230	99,7%
TOTALE	€ 7.200.000	€ 5.969.741	89,6%

La conclusione di tutte le procedure di impegno è prevista per il secondo trimestre del 2015. In particolare, saranno concluse la gara per l'affidamento del servizio *Centro Competenza Magistrato* (Linea di Azione 1) e la gara per l'affidamento del servizio di monitoraggio, valutazione e disseminazione dei risultati del progetto (Linea di Azione 3), in capo al Dipartimento della Funzione Pubblica – PCM.

PCT Sud - GOL: stato di avanzamento

I pagamenti effettuati sul progetto sono pari al 90% degli impegni perfezionati su tutte le linee di azione.

Nonostante l'ammontare delle singole richieste di pagamento sia molto basso (pari a massimo € 360.000*), determinando la predisposizione di numerose procedure e il conseguente dilungamento dei tempi, l'Amministrazione riesce a pagare le fatture in tempi brevi. A fine dicembre sono stati accreditati € 5,375 milioni e rimangono da pagare fatture per un ammontare pari a circa € 210.000.



PCT Sud – GOL	Impegni	Pagamenti	Avanzamento dei pagamenti
Linea di Azione 1	€ 4.154.525	€ 3.943.061,69	94,9%
Linea di Azione 2	€ 1.544.986	€ 1.271.552,00	82,3%
Linea di Azione 3	<i>Procedura di gara in corso</i>	N/A	N/A
Assistenza Tecnica	€ 270.230	€ 157.380,00	58,2%
TOTALE	€ 5.969.741	€ 5.371.993,69	90%

* Ovvero pari al 5% del finanziamento totale del progetto.

PCT Sud - GOL: sintesi finanziaria



Il progetto ad oggi ha finanziato le seguenti attività:

- Potenziamento delle **sale server** interdistrettuali;
- Potenziamento della **dotazione hardware** di magistrati e cancellieri (pc fissi e portatili, scanner e stampanti);
- Servizi di installazione della **Consolle del Magistrato**;
- Servizi di **affiancamento e assistenza** all'avvio nell'utilizzo della Consolle del Magistrato e assistenza organizzativa.

PCT Sud - GOL: risultati

Sono state potenziate le **sale server** di:

- **Genova**
- **Napoli**
- **Messina**
- **Catania**

con un impegno totale di **€1.265.117**



Sono stati acquistati i seguenti hardware:

- **1045 pc portatili**
- **1479 pc desktop**
- **885 monitor**
- **471 scanner**
- **943 stampanti**



Sono state erogate:

- Oltre **1.900 gg/uu di installazione** del sw e bonifica della base dati;
- Oltre **3.000 gg/uu di addestramento e assistenza** all'avvio nell'utilizzo della *Consolle*;
- Oltre **1.800 gg/uu di assistenza organizzativa**.

Rimangono da attivare entro il I trimestre 2015:

- **Centro Competenza Magistrati**
- Attività di **monitoraggio, valutazione** del progetto e analisi delle serialità (Linea di Azione 3)

PCT Sud - GOL: risultati

Andamento mensile dei depositi effettuati da soggetti esterni




Nel mese di ottobre 2014 sono stati depositati **79.250 atti telematici in più rispetto al mese di settembre**, con un incremento del 61% .



PCT Sud - GOL: risultati

Andamento mensile dei depositi effettuati da soggetti esterni

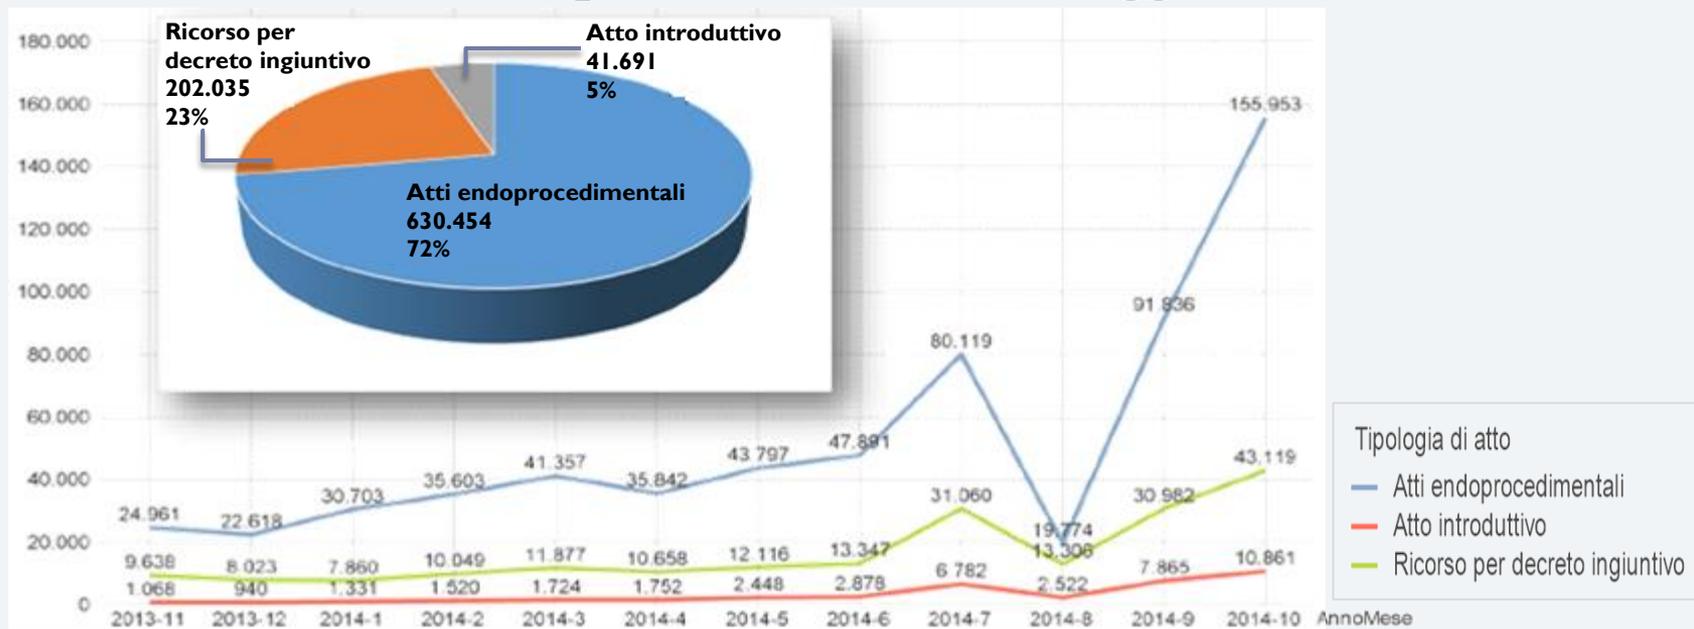


Dati aggiornati ad Ottobre 2014

- ▶ 155.953 atti endo-procedimentali, 64.117 in più **rispetto a settembre (+70%)** e 75.834 in **più rispetto a luglio (+95%)**;
- ▶ 43.119 ricorsi per decreto ingiuntivo, 12.137 in **più rispetto a settembre (+39%)** e 12.059 in **più rispetto a luglio (+39%)**;
- ▶ 10.861 atti introduttivi, 2.996 in **più rispetto a settembre (+38%)** e 4.079 in **più rispetto a luglio (+60%)**.


PCT Sud - GOL: risultati

Andamento mensile dei depositi effettuati da soggetti esterni

Per tipologia di soggetto depositante

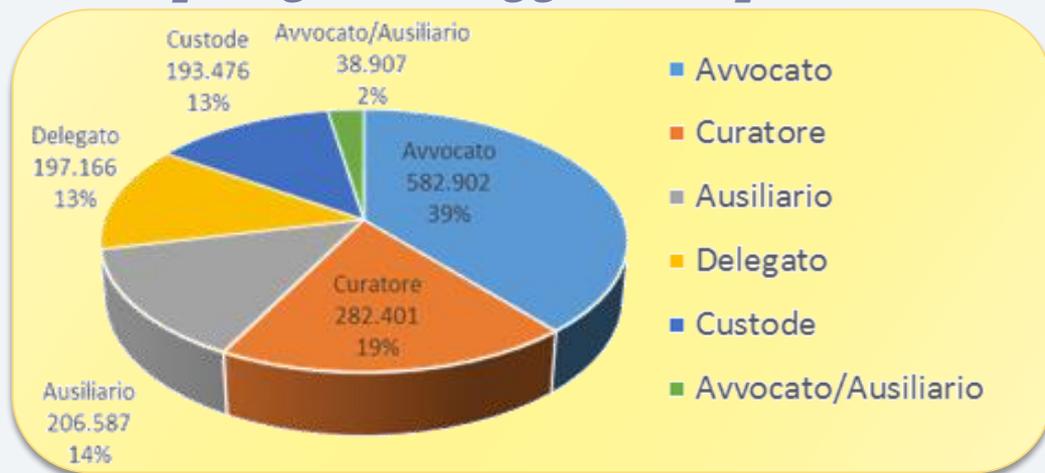

Per ambito processuale

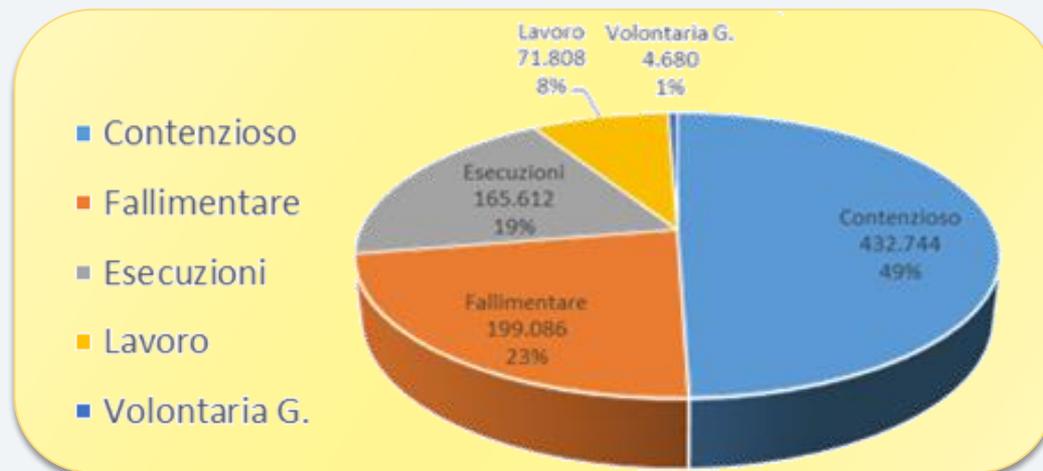

PCT Sud - GOL: risultati

Andamento mensile dei depositi telematici dei magistrati




Nel mese di ottobre 2014 sono stati depositati **94.542 atti telematici in più rispetto al mese di settembre**, con un incremento del **69%** .

Ottobre 2013 → **Ottobre 2014**
81.751 → **230.862**
+ 282%


PCT Sud - GOL: risultati

Andamento mensile dei depositi effettuati dai magistrati

Per tipologia di atto

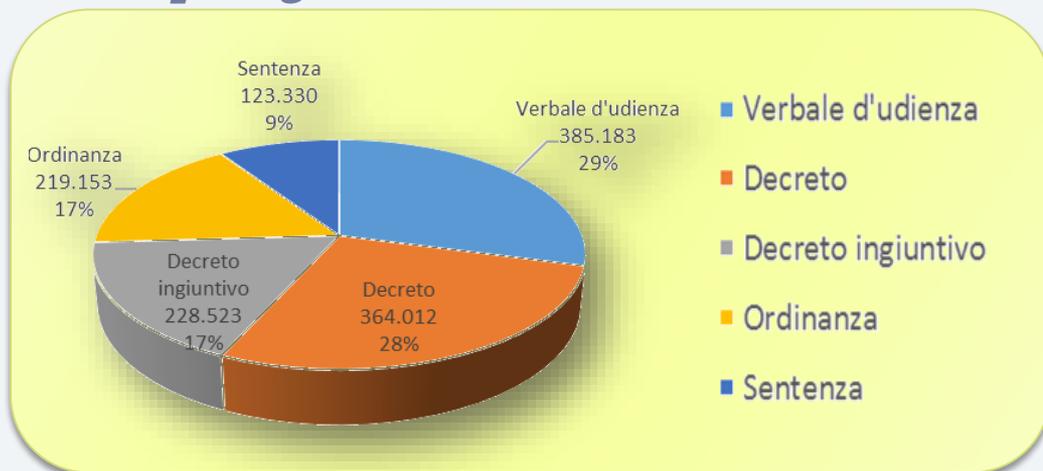

Per ambito processuale

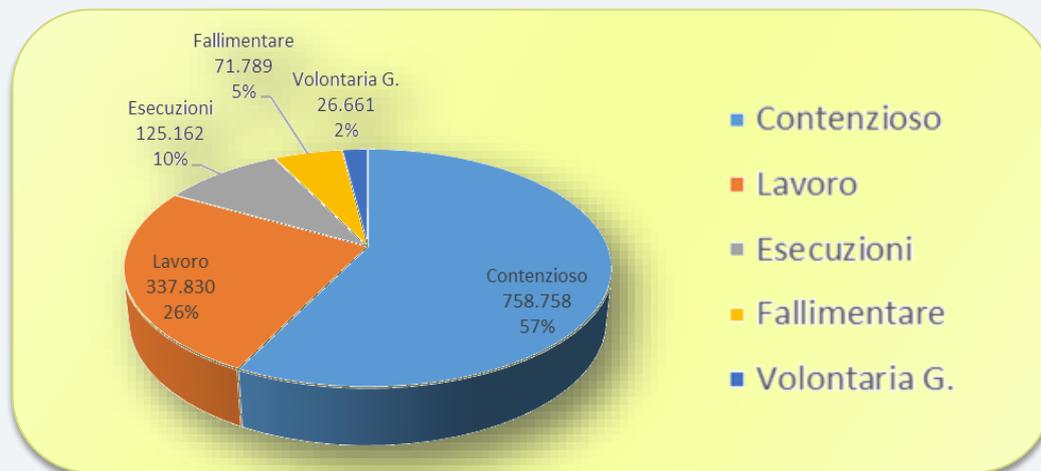

PCT Sud - GOL: risultati

Depositi telematici dei magistrati – numero di atti depositati

Numero di atti depositati ad Ottobre 2013 ed Ottobre 2014, con evidenza della variazione

Distretto	Ottobre 2013	Ottobre 2014	Variazione percentuale
Bari	1.980	3.702	187%
Cagliari	762	7.654	1.004%
Caltanissetta	962	3.145	327%
Campobasso	20	407	2.035%
Catania	1.156	6.688	579%
Catanzaro	605	3.750	620%
L'Aquila	2.333	6.029	258%
Lecce	10	2.225	22.250%
Messina	101	2.660	2.634%
Napoli	4.027	18.702	464%
Palermo	2.165	11.087	512%
Potenza	660	2.352	356%
Reggio Calabria	463	2.009	434%
Salerno	144	2.145	1.490%

PCT Sud - GOL: adempimenti

Monitoraggio fisico e finanziario

In ottemperanza alle richieste del DPS e dell'IGRUE, sono stati implementati in maniera costante i dati di **monitoraggio fisico e finanziario** nei sistemi del MEF, garantendo sempre il rispetto delle scadenze bimestrali.

Monitoraggio rinforzato

Come richiesto dal DPS, è stato effettuato il **monitoraggio rinforzato** sul programma al fine di condividere lo stato di avanzamento dello stesso e di ottenere un quadro complessivo dello stato di attuazione del Piano di Azione e Coesione.

Rapporto sintetico annuale

Il documento è stato predisposto entro il 31 Marzo 2014 e costituisce il resoconto, elaborato seguendo le linee direttrici indicate dal DPS-MISE, al 31 Dicembre 2013 di quanto realizzato con il Programma.

PCT Sud - GOL: criticità riscontrate

Tra le principali criticità riscontrate nella gestione delle attività si evidenziano:

- ▶ il **ritardo** nell'**accredito** delle **risorse** relative all'**anticipo**, avvenuto in data 11/11/2013, ha posticipato l'avvio dei pagamenti, determinando, pertanto, uno slittamento rispetto alla pianificazione iniziale;
- ▶ l'**eccessivo frazionamento dei pagamenti** (limitati alla soglia del 5% dell'importo del Programma, ovvero € 360.000), obbliga ad avviare continue e numerose procedure per il pagamento delle fatture e per il relativo rimborso, dilatando i tempi di pagamento;
- ▶ i **lungi tempi** di **elaborazione** delle **Richieste Di Erogazione** e di definizione delle **Domande di Pagamento** (non inferiori a 25 giorni), a causa della soglia di € 360.000 per i pagamenti;
- ▶ lo **slittamento significativo** nell'avvio delle attività previste per il **Centro Competenza Magistrati**, a causa di irregolarità riscontrate in sede di gara, che ne ha determinato l'annullamento e il nuovo avvio. Si prevede il completamento delle attività entro il I quadrimestre del 2015.

PCT Sud - GOL: prossimi step

